

**PROTOCOLO DESINFECCIÓN POR INICIO DE ACTIVIDAD
TERMO ELÉCTRICO Nº 9 GRIFOS VESTUARIOS FEMENINO
ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO A /2ª DEL RD/865**


CLIENTE	(ENVASES SOPLADOS)		
DIRECCIÓN	P.I. Ave Mª, 37-43 Andújar (Jaén)		
EMPRESA QUE REALIZA LOS TRABAJOS	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L.		
FECHA INICIO	18 de JUNIO 2020	FECHA FINALIZACIÓN	18 de JUNIO 2020
DIRECTOR TÉCNICO	Antonio Fernández Bonilla	TÉCNICOS	Rafael Zandubete Castro
TRABAJOS	DESINFECCIÓN DE TERMO ELÉCTRICO Nº 9 , GRIFOS VESTUARIO FEMENINO Y SU RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA		

DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L., lleva a cabo sus tratamientos de forma esmerada y con la mayor dedicación, como muestra las actividades que a continuación se detallan, las cuales se han realizado a sus equipos.

Aumentamos el rango del termo eléctrico hasta que alcanza valores en el agua de salida de 70°C.

TOMA DE RESIDUALES

Se abren los grifos de forma secuencial, es decir, distribuyéndolos de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. Abrimos por sectores todos los grifos y duchas, comprobando que en los puntos terminales de la red se alcancen temperaturas >60°C.

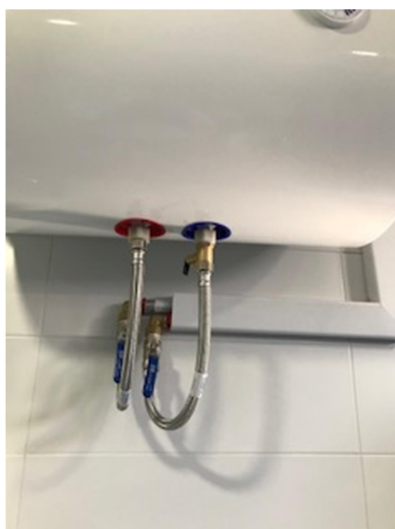

**CERTIFICADO DESINFECCIÓN INICIO DE ACTIVIDAD
TERMO ELÉCTRICO Nº 9, GRIFOS VESTUARIOS FEMENINO
ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO A /2ª DEL RD/865****EMPRESA CONTRATADA**

NOMBRE	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L		
ROESBA	Nº 0486-AND-450		
DOMICILIO SOCIAL	C/ SEVILLA Nº 45, 18195, CÚLLAR VEGA, GRANADA		
DIRECCIÓN ALMACÉN	C/ LOS JUNCOS CORTIJO LA PURISIMA NAVE 13 A, 18006, GRANADA		
C.I.F.	B- 18539288	TELÉFONO	958-58.21.53

CONTRATANTE

NOMBRE	ENVASES SOPLADOS		
DOMICILIO	P.I. Ave Mª, 37-43 Andújar (Jaén)		
INSTALACIÓN TRATADA	DESINFECCIÓN TERMO ELÉCTRICO Nº 9, GRIFOS VESTUARIO FEMENINO		
INSTALACIÓN NOTIFICADA	NO APLICA		
C.I.F.	B-96475058	TELÉFONO	958 78 05 19

FECHA DESINFECCIÓN	18 de JUNIO 2020
ESTADO INSTALACIÓN	EN BUEN ESTADO

PROTOCOLO SEGUIDO

Aumentamos el rango del termo eléctrico hasta que alcanza valores en el agua de salida de 70°C.

Se abren los grifos de forma secuencial, es decir, distribuyéndolos de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. Abrimos por sectores todos los grifos y duchas, comprobando que en los puntos terminales de la red se alcancen temperaturas mínimas de 60°C.

Se realizan tomas de residual de todos los grifos y duchas,

DIRECTOR TÉCNICO

NOMBRE	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA
D.N.I.	24242946-A
TITULACIÓN	- SEA251_3 CAPACITACIÓN RESPONSABLES TÉCNICOS DE SERVICIOS BIOCIDAS.

TÉCNICO APLICADOR TRATAMIENTO

NOMBRE	RAFAEL ZANDUBETE CASTRO
D.N.I.	24240818-Z
TITULACIÓN	ACTUALIZACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS

RESPONSABLE INSTALACIÓN

NOMBRE	
D.N.I.	

RESPONSABLE INSTALACIÓN	TECNICO APLICADOR	DIRECTOR TÉCNICO
		
