

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN


CLIENTE	HERMANAS HOSPITALARIAS MÁLAGA		
DIRECCIÓN	C/ San Juan Bosco 41, Málaga		
EMPRESA	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L.		
FECHA INICIO	22 -MAYO-2018	FECHA FINALIZACIÓN	23 -MAYO-2018
DIRECTOR TÉCNICO	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA	TÉCNICOS	Rafael Zandubete
TRABAJO	- DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE ALJIBE CONTRA INCENDIOS Y SU REDES DE DISTRIBUCIÓN EDF CENTRALES		

DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE realiza sus tratamientos de forma esmerada y con la mayor dedicación, como muestra las actividades que a continuación se detallan, las cuales se han realizado a sus equipos.

DIA 22 DE MAYO DESINFECCION ALJIBE EDF CENTRALES

Cortamos el aporte de agua al aljibe y conectamos el equipo de cloración automática, a clorar el agua del aljibe

Procedemos mediante este equipo de cloración automática, a clorar el agua del aljibe aportando 10 litros de cloro (BRENTANG) y alcanzando un residual de 22 mg/l de cloro residual libre

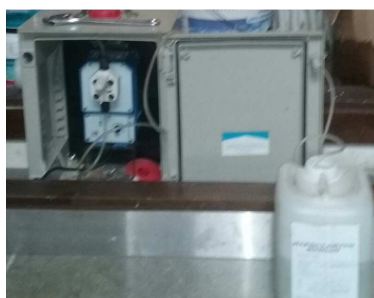

DESINFECCIÓN DE RED

- Abrimos el último punto de la red durante treinta minutos, medimos el cloro y obtenemos un valor de 7 mg/l de cloro residual libre en el agua de purga, cerramos y dejamos sin neutralizar el agua en la red.

NEUTRALIZACIÓN AGUA ALJIBE:


- Una vez clorada la red, conectamos el equipo de dosificación automática, esta vez introducimos en el aljibe, un neutralizante del cloro (TECNA REDOX) y lo dejamos toda la noche.

DÍA 23 DE MAYO

- Medimos el residual de cloro, obtenemos un valor de 0'7 mg/l de cloro.
- Introducimos unos equipos de extracción de aguay procedemos al vaciado del aljibe contra incendios.

LIMPIEZA MECÁNICA

- Una vez vaciado el aljibe, procedemos a la limpieza en profundidad mediante máquina de agua a presión, cepillado de todas las paredes, suelo, pilares que se encuentran en contacto con el agua. Sedimentos y agua se achican hasta obtener el máximo de limpieza.

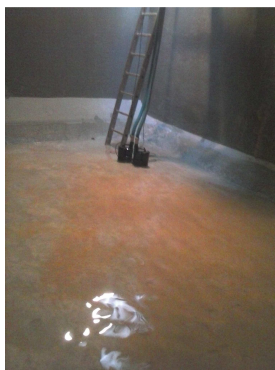

LLENADO

Como el agua del aljibe potable esta clorada a 20 mg/l de cloro , la cogemos y con las bombas de extracción la trasladamos a este aljibe. De este modo no tenemos que tirar el agua y la utilizamos para esta instalación. Conseguimos llenarlo hasta el 65% de su capacidad y terminamos de llenarlo con agua de la red.

Medimos el agua interior del aljibe contra incendios teniendo un residual de 15 mg/l de cloro. Como esta agua permanecerá sin renovación hasta la próxima limpieza **NO NEUTRALIZAMOS EL CLORO.**

CERTIFICADO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**EMPRESA CONTRATADA**

NOMBRE	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L		
ROESBA	Nº 0486-AND-450		
DOMICILIO SOCIAL	C/ SEVILLA Nº 45, 18195, CULAR VEGA, GRANADA		
DIRECCIÓN ALMACEN	C/ LOS JUNCOS CORTIJO LA PURISIMA NAVE 13 A 18006, GRANADA		
C.I.F.	B- 18539288	TELÉFONO / FAX	958-58.21.53

CONTRATANTE

NOMBRE	HERMANAS HOSPITALARIAS MÁLAGA		
DOMICILIO	C/ San Juan Bosco 41, Málaga		
INSTALACIÓN TRATADA	ALJIBE DE AGUA CONTRA INCENDIOS Y SU RED EDF CENTRALES		
INSTALACIÓN NOTIFICADA	NO APLICA		
C.I.F.		TELÉFONO / FAX	952 25 61 50

FECHA DESINFECCIÓN	22 Y 23 -MAYO-2018
ESTADO INSTALACIÓN	BUENO

PRODUCTOS UTILIZADOS

NOMBRE COMERCIAL	HIPOCLORITO SÓDICO PWG	DOSIS EMP	10 LITROS
FABRICANTE	BRENTAG	Nº REGISTRO	01-2119488154-34-XXXX
Nº CAS	7681-52-9	Nº CE	231-668-3
PROTOCOLO SEGUIDO	ADJUNTO A ESTE DOCUMENTO.		
RESIDUALES ALCANZADOS	22 MLG/L	ACTUACIÓN	36 HORAS

NO NEUTRALIZACIÓN EL CLORO DEL ALJIBE**DIRECTOR TÉCNICO**

NOMBRE	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA
D.N.I.	24242946-A
TITULACIÓN	- SEA251_3 CAPACITACIÓN RESPONSABLES TÉCNICOS DE SERVICIOS BIOCIDAS.

TÉCNICO APLICADOR TRATAMIENTO

NOMBRE	RAFAEL ZANDUBETE CASTRO
D.N.I.	24240818-Z
TITULACIÓN	ACTUALIZACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS

RESPONSABLE INSTALACIÓN

NOMBRE	FRANCISCO GONZALEZ
D.N.I.	

FIRMA DEL RESPONSABLE INSTALACIÓN	FIRMA DEL TÉCNICO APLICADOR	FIRMA DEL RESPONSABLE TÉCNICO
	
